ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

Nota de Esclarecimento

Em resposta ao questionamento da qualidade do meio fio das Ruas Dom Aquino Correia, Rua Rodrigues Alves e Rua Afonso Pena (Bairro Rotary), informamos que estes problemas já havia sido identificados por meio da fiscalização do setor de engenharia e todas as ações já foram tomadas para correção dos problemas identificados.

No dia 06 de janeiro de 2019 o setor de engenharia havia notificado à empresa contratada sobre as ocorrências conforme mostra a figura:

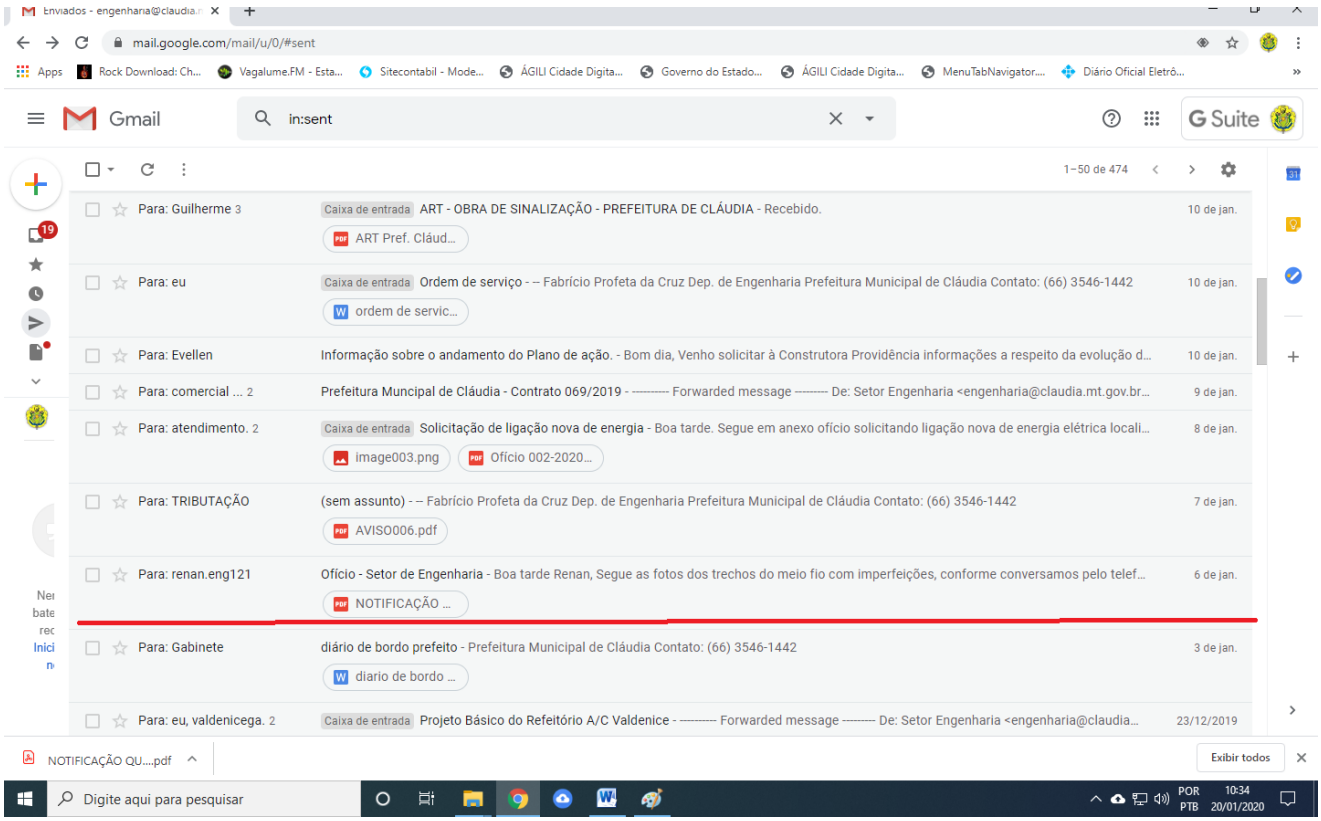

Figura 1 –

Na notificação apontamos os trechos onde a empresa contratada deverá refazer o meio fio num prazo de 10 dias após o recebimento da notificação, conforme documento em anexo.

Informamos ainda que a contratada já havia se prontificado em realizar as correções apontadas na notificação.

Gmail by Google

Setor Engenharia <engenharia@claudia.mt.gov.br>

Ofício - Setor de Engenharia

Setor Engenharia <engenharia@claudia.mt.gov.br> 6 de janeiro de 2020 14:54
Para: renan.eng121@gmail.com

Boa tarde Renan,

Segue as fotos dos trechos do meio fio com imperfeições, conforme conversamos pelo telefone.

Atenciosamente

Fabrício Profeta
Setor de Engenharia
Prefeitura Municipal de Cláudia

--
Fabrício Profeta da Cruz
Dep. de Engenharia
Prefeitura Municipal de Cláudia
Contato: (66) 3546-1442

NOTIFICAÇÃO QUEIROS LIMA001.pdf
548K

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

Ofício nº 001/2020/SENG **Cláudia/MT, 06 de janeiro de 2020.**

Ilmo. Senhor
RENAN SILVA LIMA
Responsável Legal.
Construtora Queiroz Lima Eireli

Assunto: Notificação à Construtora Queiroz Lima Eireli, contrato 081/2018.

Prezado Senhor,

Viemos, por meio deste, notificar a Construtora Queiroz Lima Eireli a reparar e regularizar as pendências relacionadas à construção de meio fio nas Ruas Rodrigues Alves, Afonso Pena e Dom Aquino Correia. Dentre as pendências destaca-se:

- Meio fio desalinhado, alguns trechos são perceptíveis visualmente o desalinhamento no meio fio;
- Trecho com emendas irregulares, foram observados vário trechos com emendas sem acabamento ou até mesmo com interrupções;
- Desagregação do concreto no topo do meio fio, em alguns trechos forma observados desagregação no topo do meio fio ficando os agregados (pedra) a mostra.
- Acumulo de água na sarjeta, no trecho da Rua Rodrigues Alves houve um acumulo de água na sarjeta.

Tendo em vista tais apontamentos, fica a empresa notificada a reparar num prazo de 10 dias, a contar pela data do recebimento.

Respeitosamente,

Fabrício Profeta da Cruz
Setor de Engenharia
Prefeitura Municipal de Cláudia
